



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 302/SMC/2022

Juara - MT, 22 de novembro de 2022.

A Senhora
Marta Dalpiaz Nepomuceno
Câmara Municipal de Juara

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1584/2022
Data: 30/11/2022 - Horário: 14.22
Administrativo

ASSUNTO: Resposta ao Ofício 093/GVMD/2022

Marta Dalpiaz Nepomuceno - Vereadora

Protocolo nº 632/2022 – 30/11/2022

Assunto: Ofício nº 302/SMC/2022 - Em resposta ao Ofício nº 093/GVMD/2022 -
Referente informações referente a paralização da execução da Obra de Drenagem e
Pavimentação Asfáltica da Rua Argentina, no Jardim América

Prezada,

Na oportunidade em que cumprimento a Vossa Senhoria, venho por meio deste apresentar as informações solicitadas no ofício acima descrito, o que segue:

“Tem recebido várias informações e/ou questionamentos referente a paralização da execução da Obra de Drenagem e pavimentação asfáltica da rua Argentina, no Jardim América”.

A empresa executora do contrato 226/22 do objeto “**Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da rua Argentina e diversas ruas do município de Juara/MT**”, sendo ela a CALÁBRIA MHG CONSTRUTORA, que também executa o contrato 194/22 do objeto “**Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do bairro Porto Seguro II do município de Juara/MT**”, ambos os contratos estão em período efetivo de execução, tendo em vista que o número de munícipes residentes no bairro Porto Seguro é superior em relação aos moradores confrontantes com a Rua Argentina e demais ruas do contrato 226/22 a empresa executora priorizou o término de rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica do contrato 126/22 compreendendo que o período de chuvas poderiam trazer transtornos aos moradores sem a conclusão das atividades envolvendo terraplanagem.

Porém a obra não ocorre somente em vias físicas e visíveis in loco, a empresa é fabricante dos tubos de concreto que estão sendo utilizados na rede de drenagem da Rua Argentina e demais ruas do contrato, essa fabricação ocorre na sede da empresa que não está situada nas proximidades da obra, então ocorre que a obra está em andamento interno e aparentemente no local está “paralisada”, abaixo



ESTADO DE MATO GROSSO


Prefeitura Municipal de Juara

seguem fotos georreferenciadas do mês de novembro, comprovando que a obra **NÃO ESTÁ PARALISADA.**

Imagem 01 – Obra do contrato 226/22 no dia 10/11/2022



Imagem 02 – Obra do contrato 226/22 no dia 11/11/2022

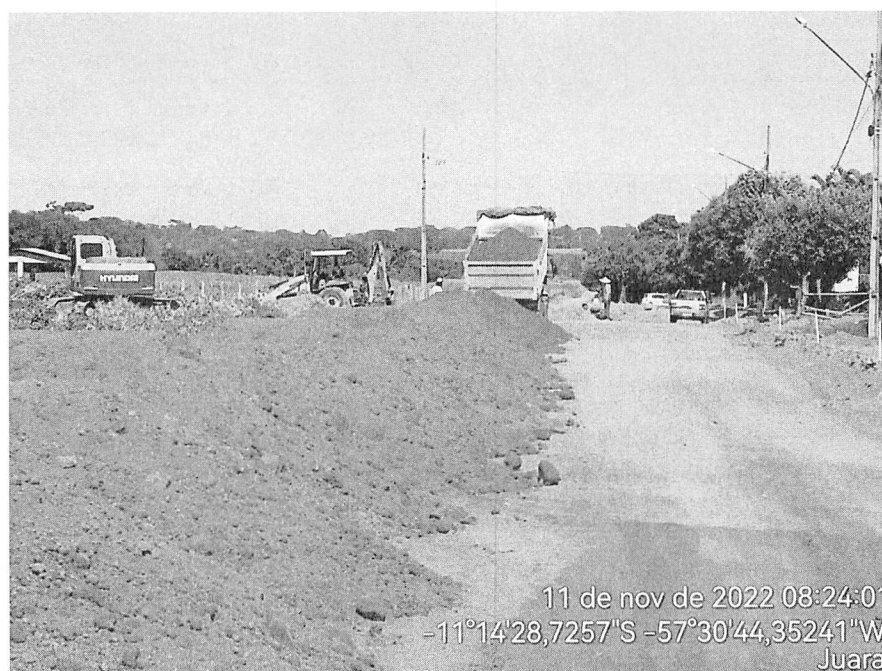



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Imagem 03 – Obra do contrato 226/22 no dia 17/11/2022

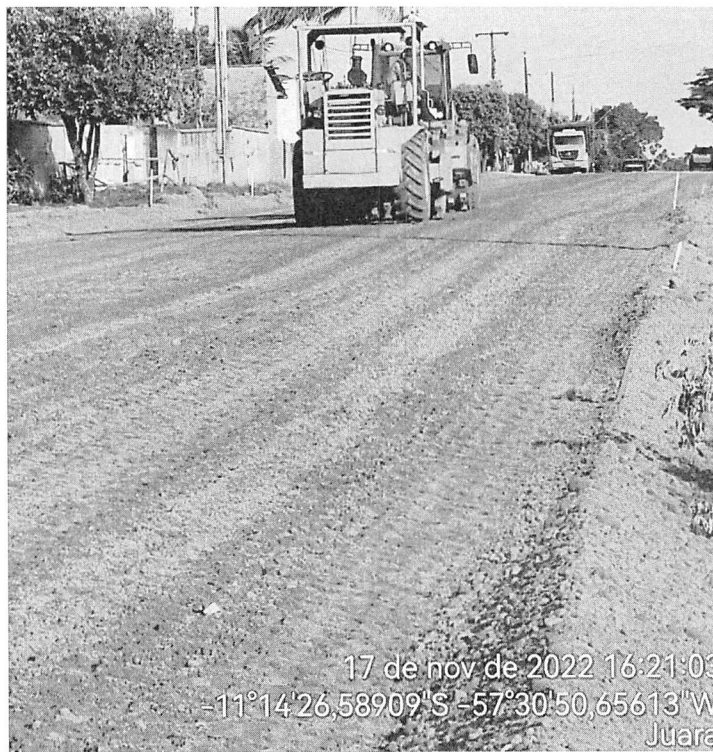


Imagem 04 – Obra do contrato 226/22 no dia 18/11/2022





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Imagem 05 – Obra do contrato 226/22 no dia 19/11/2022



Sendo só para o momento, antecipo os agradecimentos e apreços.

Atenciosamente;

Patricia da Silva

Engenheira civil CREA MT 50368
Fiscal de obras - Portaria 290/22

Joaquim Tolovi Junior

Sec. Adj. de Cidade
Portaria 058/2021
