



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 582/2021 - GP

Juara-MT, 08 de Julho de 2021.

Ao Senhor
Vereador Luciano Aparecido de Oliveira
Primeiro Secretário
Câmara Municipal de Juara-MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 780/2021
Data: 08/07/2021 - Horário: 14:43
Administrativo

Assunto: Resposta ao Ofício nº 163/GVLO/2021

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 351/2021 – 08/07/2021


Assunto: Ofício nº 582/2021 - GP - Em resposta ao Ofício nº 123-GVLO2021 - Referente situação e cumprimento das metas elencadas para os anos 2020/2021 – Projetos e Licenciamentos ETE e 2021/2022 – Início Construção ETE/Coletores, especificando quais já foram atendidas e/ou fase resta para concluir cada etapa.

Senhor Vereador,

Na oportunidade em que respeitosamente cumprimento Vossa Senhoria e demais *Edis* desta Casa de Leis, venho em resposta ao Ofício supracitado encaminho em anexo, cópia do Ofício nº 038/AMD/2021 da Concessionária Águas de Juara relatando cumprimentos de todas as metas pactuadas junto a Concessão.

Na certeza de ter atendido vossa solicitação e não havendo mais para o momento, elevo protestos de estimas e considerações.

Atenciosamente,


Antônio José Santana Neto
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria GP nº 003/2021

Ofício n.º 038/AMD/2021

Juara-MT, 05 de julho de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
GABINETE DO PREFEITO
Antônio Jose Santana Neto
Chefe de Gabinete

Assunto: EM RESPOSTA AO OFICIO Nº 560/2021 - GP

Presado Senhor,

Cumprimentando nesta oportunidade, em atendimento a vossa solicitação referente ao cumprimento das metas previstas na "Clausula Quarta do Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico e Financeiro ao Contrato de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário desta Cidade", referente ao período de 2020/2021 e 2021/2022, informamos que:

Conforme proposta de reequilíbrio econômico financeiro e Aditivo de Contrato de Concessão, as metas para o período de 2020/2021 eram as seguintes:

1. Assumir em 90 dias os distritos de Paranorte e Águas Claras;
2. Executar obras de melhorias nos sistemas dos Distritos;
3. Projetos e Licenciamentos ETE II;
4. Manutenção do sistema existente.

Distritos Águas Claras e Paranorte:

Assumimos os sistemas dentro do prazo estipulado no mês 09/2020.

Foram realizados todos os investimentos que estavam previstos nas planilhas de investimentos constantes da proposta de reequilíbrio econômico financeiro, anexo ao Aditivo Contratual, tais como: Execução de novos trechos com redes de distribuição (PVC 60 mm); várias interligações de Redes, para melhor recirculação e vazão; substituição de todas as ligações prediais; reforma em todo sistema captação e distribuição de água; construção e reformas laboratório, abrigo, almoxarifado; desinfecção e limpeza em todos os poços; substituição de todas as bombas dos poços; automação de todo sistema de captação e distribuição; reforma cercas alambrados; sistema SPA em todos os distritos para descarga atmosférica; outorga dos poços e outros...

ETE II – Primeiro ano 2020/2021

Houveram algumas ações não previstas em contrato para a Concessionária como a Aquisição de duas áreas de acessos, abertura do acesso (estrada vicinal), com execução de cerca lateral e posterior doação ao município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
PROTOCOLADO Nº 9058
DATA 08/07/2021
HORÁRIO 08:32 h


Concessionária Águas de Juara
Cláudio Sidnei Cristofoli
Gerente
CPF: 029.266.129-60

PROJETOS E LICENCIAMENTOS

A concepção de um projeto de esgotamento sanitário envolve varias atividades preliminares que visam subsidiar o projetista. Nesse período foram realizados os seguintes serviços:
Levantamento planialtimétrico e topográfico completo da área da ETE II, Coletores e Interceptores;
Estudos geotécnicos e hidrogeológicos para caracterização da área.

Estes estudos consistiram em:

Levantamento geológico e pedológico: local, através de mapeamento geológico e sondagens de solo (SPT e trado);

Caracterização hidrogeológica: ensaios de permeabilidade do solo, identificação do Nível de água (NA) e definição do fluxo subterrâneo;

Caracterização Hidrológica do corpo receptor - Córrego Alcebíades (Corgão): Execução de batimetria e medição de vazão a montante e a jusante do possível local de lançamento do tratamento da ETE II.

Estudo físico químico do corpo receptor esgoto, onde será feito o lançamento efluente tratado;

Elaboração Projeto de tratamento de esgoto da "B2" e ETE II;

Elaboração de projeto de redes, ligações, interceptores e coletores de esgoto;

Protocolo de licença prévia da ETE II (em andamento);


ETE II - Segundo ano 2021/2022

Início das obras da construção da ETE II e Emissário e Interceptores.

Conforme pode ser constatado até o momento foram cumpridas todas as metas contratuais constantes no Termo Aditivo de Contrato de Concessão.

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

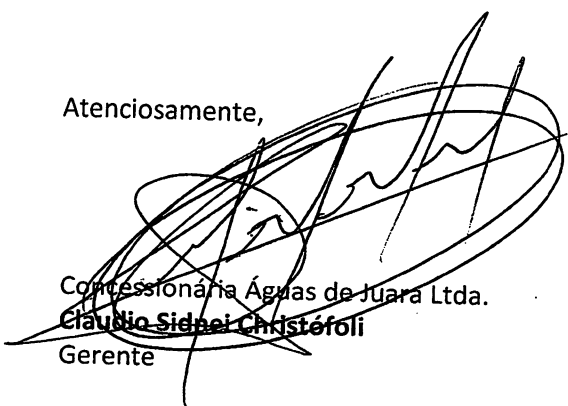

Concessionária Águas de Juara Ltda.

Claudio Sidney Christófoli

Gerente
