



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 211/SMC/2021

Juara-MT, 29 de julho de 2021.

Ao Senhor
Luciano A. de Oliveira e Outros
Vereadores Municipais

Câmara Municipal de Juara - MT

PROTOCOLO GERAL 882/2021
Data: 30/07/2021 - Horário: 14:19
Administrativo

Assunto: Resposta ao 199/GVLO/2021

Prezado Senhor,

Venho por meio deste primeiramente cumprimentá-lo e na oportunidade em atenção ao ofício supracitado, em que solicita documentações e informações quanto a Obra de Contrato nº 227/2020 (Pavimentação e Drenagem Bairro Portal das Flores e Parque Kennedy), encaminho a V. Senhoria cópia do Termo Aditivo, cópias dos Empenhos já realizados e cópia do Cronograma Físico-Financeiro Atualizado.

Logo, quanto às fases já executadas da obra, informo que:

- Item 01 - Serviços Preliminares:
 - Serviços Topográficos para Pavimentação/Placa de Obra, já executados.
- Item 02 – Terraplanagem:
 - Escavação/Execução e Compactação de Aterro, já executados.
- Item 03 – Pavimentação:
 - Regularização e Compactação de Subleito de Solo Predominantemente Argiloso, já executados;
 - Execução e Compactação de Base e/ou Sub Base para Pavimentação de Solos De Comportamento Laterítico (Arenoso), já executados;
 - E Início aos Serviços de Construção de Pavimento com Tratamento Superficial Duplo (Brita e Pedrisco) com Emulsão Asfáltica Rr-2c, Com Capa Selante. Af_01/2018.
- Item 04 – Obras Complementares:
 - Guia (Meio-Fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada In Loco em Trecho Reto com Extrusora, já executados cerca de 30% de Meio Fio.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Acrescento que, a Obra encontra-se dentro do prazo de execução, conforme Cronograma Físico-Financeiro em anexo, logo, a obra teve um período de paralisação devido ao período chuvoso (Novembro/2020 á Maio/2021), sendo assim a necessidade de sua atualização, outrossim, a obra encontra-se dentre seu sétimo e oitavo mês de execução.

Sem mais para o momento, antecipo os agradecimentos e apreços.

Atenciosamente,

Joaquim Tolovi Junior
Secr. Adjunto de Cidade
Port. nº 058/2021

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário

Protocolo nº 391/2021 – 30/07/2021

Assunto: Ofício nº 211/SMC/2021 - Em resposta ao Ofício nº 199/GVLO/2021 - Referente cópia do cronograma físico-financeiro e demais documentos relacionados a obra de pavimentação e drenagem superficial em ruas do Bairro Portal das Flores e Parque Kennedy.



Juara-MT, 02 DE JULHO DE 2021
Local/Data

GOMES:03964079197

ALLAN SALES GOMES
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 241847076
 ENGENHEIRO FISCAL - PORT. 196/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF.EMPENHO No 008806/2020 TIPO: 2

Cod.Red...: 0976

Data de Emissao: 30/06/2021

Cod.Geral: 06.002.15.451.0018.1192-44905100000

C R E D O R

Nome.....: 33025 CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
Endereco: AVENIDA PADRE OPERARIO No: 000000 No LICIT: 19/2020
Cidade...: JUINA UF: MT CNPJ/CPF: 37.683.896/0001-60
CEP.....: 78.320.000 INSC. EST:
Banco....: Ag.: Cta.: - INSC. MUN:
INSC. COM:

ESPECIFICACAO

Valor ref. a Cancelamento da N.E. 008806/2020-2. EM CUMPRIMENTO AO MEM
ORANDO 142/2021 - GB/FC/EAAKL ASSINADO PELA COORD DIV. DE FISC. DE CO
NTRATOS ELZA AP. A. KOLINSQUE LIMA - SUPRESSAO DE VALOR

DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior: 549.532,06
Valor anulado.: 15.506,27
Saldo Atual....: 534.025,79
Valor extenso.: QUINZE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi cancelada pela importan-
cia de R\$ 15.506,27 conforme
comprovantes.

JUARA , 30/06/2021.

CARLOS AMABEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

CANCELAMENTO DE DESPESA

Autorizo o cancelamento da importancia
de R\$ 15.506,27.

JUARA , 30/06/2021.

MARCIA ADOA GOMES BACHEGA
CONTADORA CRC 3532/O-8 MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Memorando nº 142/2021 – GB/FC/EAAKL

Juara - MT, 29 de Junho de 2021.

À Contadora Municipal

Sr^a Márcia Gomes Bachega

Assunto: Supressão de Valor referente ao empenho abaixo relacionado.

Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria, **SUPRESSÃO** de valor do empenho abaixo relacionado, do fornecedor CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI.

- ✓ Contrato Nº 227/2020 Apenso ao Tomada de Preços nº019/2020
- ✓ Empenho Nº 8806/2020– Valor R\$ 15.506,27

Tal solicitação se faz necessária, conforme informado no Memorando nº297/SMC/2021.

Atenciosamente,


Elza Ap. A. Kolinsque Lima

Coordenadora da Divisão de
Fiscalização de Contratos

Port. GP/019/2021 de 04/01/2021

fiscaldecontratos.prefjuara@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Memorando nº 297/SMC/2021

Juara - MT, 28 de junho de 2021

A Senhora
Márcia Regina Fernandes de Araujo
Secretária de Administração
Juara-MT

Assunto: Solicitando Termo de Aditivo de Supressão de Valores ao CR 227/2020

Prezado Senhor

Venho através do presente encaminhar a V. Senhoria, pedido do 3º Termo de aditivo de supressão de valores no valor de R\$ 15.506,27 (quinze mil, quinhentos e seis reais e vinte e sete centavos) a empresa CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI, referente a modalidade licitatória Tomada de Preço nº 019/2020, Contrato nº 227/2020, referente a obra "Contratação de empresa para pavimentação asfáltica e drenagem superficial em ruas do bairro Portal das Flores e Parque Kennedy no Município de Juara/MT".


Informo a V.S.^a, da necessidade desse pedido para dar continuidade nos serviços contratados. Segue anexa: planilha e Parecer Técnica.


Atenciosamente,


Joaquim Tolóvi Junior
Secretário Municipal Adjunto de Cidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
PROTÓCOLO Nº: 8332
DATA: 28/06/2021

09:24







ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 051/2021/SVC

Nº do Campo	Nome do Campo	Descrição
01	Anexo à Prorrogação	O presente termo refere-se a supressão de valores. Segue anexa justificativa do Fiscal responsável pela fiscalização da obra e as Planilhas.
02	Unidade de Origem	Secretaria Municipal de Cidade

DADOS DO CONTRATO ORIGINAL

Nº do Campo	Nome do Campo	Descrição
03	Nº do Processo	Processo Licitatório: Tomada de Preço: 019/2020
04	Nº do Contrato	227/2020
05	Data da Assinatura	05 DE OUTUBRO de 2020.
06	Empresa Contratada	CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
07	Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY NO MUNICIPIO DE JUARA/MT.
08	Valor Inicial	R\$ 793.125,77
09	Prazo (em dias)	365 dias

TERMO ADITIVO PROPOSTO

Nº do Campo	Nome do Campo	Descrição
10	Objeto	O presente termo refere-se Termo aditivo de supressão de valores
11	Valor ou Quantidade a Aditar	- 15.506,27 (quinze mil, quinhentos e seis reais e vinte e sete centavos)
12	Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato	*****
13	Prorrogação de Prazo de Execução da Obra	*****
14	Dotação Orçamentária	06.002.15.451.00018.1192 - 44.90:51.000 - 976
15	Fonte de Recursos	Próprio
16	Sequência de Aditivo	3º Termo Aditivo

Juara/MT, em 28 de junho de 2021.


Joaquim Tolovi Junior
Secretário Adjunto de Cidade



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

PARECER TÉCNICO

Na presente oportunidade, encaminho para apreciação a planilha de **ADITIVO DE SUPRESSÃO** referente ao instrumento contratual 227/2020 - agente executor a empresa **CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI - EPP**.

A planilha supracitada, se deu através dos serviços a serem executados com decréscimo real de valores, no montante de R\$ 15.506,27 (Quinze mil, quinhentos e seis reais e vinte e sete centavos), visto que os serviços de **TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO e TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM**, contemplava na planilha inicial da licitação o DMT 3km e 12km, referente a extração de material da JAZIDA da fazenda MUCHALAK, tendo a informar que a mesma está inapta a extração de material, sendo assim, remanejado para a JAZIDA da fazenda LUIZ FRIZON com o DMT 1,5km e 11km.


- Considerando todos os fatos abordados e a redução do DMT, obteve-se uma redução real de valores.

Sem mais, agradeço toda a cordialidade a mim dispensada e elevo protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,


Allan Sales Gomes
Engenheiro Civil - CREA/RNP 2418470776
Fiscal - Port. 196/2021


Joaquim Polóvi Júnior
Sec. Adjunto de Cidade
Port. 058/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 227/2020, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇOS nº 019/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA – ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI.

Aos 29 dias do mês de junho de 2021, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA – ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita com o CNPJ sob o 15.072.663/0001-99, com sede administrativa na Rua Niterói, 81 – N, Centro, na cidade de Juara-MT, neste ato representada pelo Prefeito Municipal o Sr. **Carlos Amadeu Sirena**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n. 2.181.389-3 SSP/PR e do CPF nº 578.160.189-91, residente e domiciliado nesta cidade de Juara/MT, doravante designado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa: **CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI**, inscrita com o CNPJ sob o n.º 37.683.896/0001-60, localizada à Avenida Padre Dúlio Liburdi, nº 515-N, Bairro São José Operário, CEP 78.320-0000, na cidade de Juara/MT, neste ato representada pelo Sr. Jurandir Alves do Nascimento, portador da Cédula de Identidade n.º 08494576 SSP/MT e CPF: 045.647.281-72, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador o Sr. Antonio Carlos Giraldeili, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.785.699-00, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade n.º 8.686-21-SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Araçuaí nº 214/W, Cidade de Juara/MT, doravante denominado, **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, observado as disposições na Lei n. 8.666/93, em especial o artigo 62, § 3º, e Processo Licitatório Tomada de Preços nº 019/2020, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Este instrumento tem como objeto a **SUPRESSÃO DE VALORES**, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme justificativa de pedido de prorrogação contratual e cronograma, em Anexos ao processo, por se tratar de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY NO MUNICIPIO DE JUARA/MT**, em atendimento da Secretaria Municipal de Cidade, conforme projeto básico, especificações e condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE

2.1 – A finalidade deste instrumento é manter os serviços contratados, através de **SUPRESSÃO DE VALORES**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 – Este instrumento entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES SUPRIMIDOS

4.1 – O valor da referente supressão é de **R\$ 15.506,27 (quinze mil quinhentos e seis reais e vinte e sete centavos)**, alocado na seguinte dotação orçamentária:



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

- ✓ Secretaria Municipal de Cidade
- ✓ Departamento de Pavimentação Asfáltica
- ✓ Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas - 1192
- ✓ Outros Serviços de Pessoa Jurídica
- ✓ 06.002.15.451.00018.1192 - 44.90.51.000 - 976
- ✓ Valor Global R\$ 15.506,27

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 – Permanecem inalteradas e ratificadas as demais condições do contrato e demais cláusulas do ato convocatório, que são partes integrantes deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEXTA – DA DIVULGAÇÃO

6.1 – A alteração será divulgada na imprensa oficial.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO

7.1 – As dúvidas decorrentes do presente termo serão dirimidas no Foro e Comarca de Juara – Estado de Mato Grosso, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais.

Juara /MT, em 29 de junho de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeitura Municipal de Juara/MT
CONTRATANTE

CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
CNPJ 37.683.896/0001-60
Sr. Jurandir Alves do Nascimento
RG 08494576 SSP/MT e CPF 045.647.281-72
Promitente Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA



PLANILHA DE SERVIÇOS ACRESCIDOS, DECRETOS E EXTRA-CONTRATUAIS

CONTRATO: 227/2020

OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial em Ruas do Bairro Portal das Flores e Parque Kennedy no Município de Juara/MT

EMPRESA: Construtora Nascimento Eireli CNPJ: 37.683.896/0001-60

PROPR: Prefeitura Municipal de Juara - MT CNPJ: 15.072.663/0001-99

Engenheiro Responsável pela Execução: Gislei Amorim Brito CREA RN 1012687538

Engenheiro Responsável pela Fiscalização: Allan Sales Gomes CREA RN 241847077-6

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY - JUARA - MT

Refer:

Local:

Fonte de Pesquisa:

B.D.I. TRANSP. 16,75%
26,74%

Item	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇOS		QUANT. A EXECUTAR	PLANILHA DO 3º TERMO ADITIVO		VALOR DO ADITIVO	QUANT.	VALOR	% EXEC.
					Unit. COM BDI	TOTAL		QUANTIDADE (+)	QUANTIDADE (-)				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	16.958,00	0,13	2.202,54	11.193,60				5764,40	R\$ 730,58	33,17%
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (dimensão 4,00x5,00m)	m2	20,00	519,63	10.392,60	0,00				20,00	R\$ 10.392,68	100,00%
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00X3,00 METROS - 2 unidades)	m2	12,00	392,89	4.714,68	0,00				12,00	R\$ 4.714,68	100,00%
		1º SUB-TOTAL				17.309,82						R\$ 15.837,94	91,50%
2.0		TERRAPLANAGEM											
2.1	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m3	6.397,35	3,17	20.279,59	4.271,12				2126,23	R\$ 6.736,96	33,22%
	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	566,00	5,70	3.226,20	280,00				286,00	R\$ 1.631,14	50,56%
2.2		2º SUB-TOTAL				23.505,79						R\$ 8.368,10	35,60%
3.0		PAVIMENTAÇÃO											
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	m2	16.958,00	0,70	11.870,60	11.193,60				5764,40	R\$ 4.018,19	33,85%
3.2	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	2.758,10	5,07	13.983,56	1.689,62				1068,48	R\$ 5.416,77	38,74%
3.3	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	2.758,10	5,07	13.983,56	1.689,62				1068,48	R\$ 5.416,77	38,74%
3.4	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	5.516,20	1,39	7.667,51	3.379,24				2136,96	R\$ 2.979,22	38,86%

3.5	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	txkm	20.685,75	0,53	10.963,44	16.463,06		-10.126,99	-R\$ 5.320,47	4222,69	R\$ 2.218,50	20,24%
3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	txkm	82.743,00	0,53	43.583,79	65.852,24		-19.387,69	-R\$ 10.185,81	16890,76	R\$ 8.873,98	20,36%
3.7	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m2	15.652,40	8,24	128.975,77	10.324,20				5328,20	R\$ 43.894,24	34,03%
3.8	97807	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	m2	15.652,40	13,94	218.194,45	10.324,20				5328,20	R\$ 74.282,57	34,04%
3.9	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (DMT 700km)	txkm	43.513,67	0,53	23.062,24	43.513,67				0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.10	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRISCO) (DMT 200 km)	txkm	78.230,70	0,53	41.462,27	78.230,70				0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.11	72845	TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHÃO CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASCULANTE 6 M3	T	399,14	3,80	1.516,73	399,14				0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.12	99060	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UND	10,00	95,06	950,60	10,00				0,00	R\$ 0,00	0,00%
		3º SUB-TOTAL				516.214,52						R\$ 147.100,23	28,50%
4.0		OBRAS COMPLEMENTARES											
4.1	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	m	4.168,00	53,23	221.862,64	2.810,00				1358,00	R\$ 72.287,43	32,58%
4.2	****	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (ensaios de compactação da sub-base e base)	m³	2.758,10	1,84	5.074,90	2.758,10				0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NÚM 16 COM PINTURA REFLETIVA (regulamentação de trânsito "PARE" E "40KM") (18 unid. PARE : 6unid. 40km)	m2	6,78	849,16	5.757,30	6,78				0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4	35275	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (comprimento de 2,60m)	m	62,40	54,50	3.400,80	62,40				0,00	R\$ 0,00	0,00%
		4º SUB-TOTAL				236.095,64						R\$ 72.287,43	30,62%
		TOTAL GERAL R\$				793.125,77						ACUMULADO TOTAL	
						777.619,50						R\$ 243.593,70	30,71%

IIIARA-MT. JUNHO DE 2021.

VALOR DO ADITIVO DE SUPRESSÃO: R\$ 15.506,27 - QUINZE MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISSENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Allan Sales Gomes
Engenheiro Civil - CREA RN 2418470776
Engenheiro Fiscal de Obras - Portaria 196/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 472
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 29/03/2021
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº: 73=372/0110
Data do Empenho: 5/10/2020

Refer. Empenho Nº: 008806/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000976 - 06.002.15.451.0018.1192-4490.51.00.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
Função de Governo: 15 - URBANISMO
SubFunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0018 - UMA CIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade (Ação): 1192 - PAVIMENT. ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	793.125,77
Saldo Anterior:	636.926,85
O.P. 002 Parcela	87.394,79
Saldo a Pagar:	549.532,06

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 09 8	ISSQN - PREST SERV. NA FONTE A RECOLHER - GERAL	-1.756,64

0,00
Total de Consignações: -1.756,64
Valor Líquido à Pagar: 85.638,15
Cód: 33025
Conta:

Pague-se à CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 37.683.896/0001.60 Banco: Agência:
à quantia de OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Proveniente de: VLR. RE.F. AO CONTRATO NR. 227/2020 COM OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY CONF SOLICI. DA SECRET. DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 019/2020

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	32901	85.638,15
					85.638,15

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____
RG/DOC: _____

JUARA - MT, 29 de Março de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretario (a)

29/03/2021

Banco do Brasil

G3372909273744401
29/03/2021 09:31:55



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.56
2836302836 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE JUARA

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0821-4 - SICREDI VALE DO JURUENA

CONTA: 52.879-7

FAVORECIDO: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 37.683.896/0001-60

85.638,15

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB:

5.FC6.202.269.4F2.651

29/03/2021

Banco do Brasil

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42
283602836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2021
NR. DOCUMENTO	552.836.000.011.322
VALOR TOTAL	1.756,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JUARA ISSQN
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.322-0
NR. DOCUMENTO 552.836.000.011.005
=====

NR. AUTENTICACAO	E.9E7.17C.EF6.C52.3DA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC862863 JOSE R P ALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

NOTA DE LIQUIDACAO N° 000019

Ref. Empenho N°.: 008806/2020
Ref. Processo N°: 000000/0000
Ref. Apenso N°: 332/0110
Data do Empenho: 05/10/2020

Data de Emissao: 24/03/2021

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0976
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade.....: 002 DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
Funcao.....: 15 URBANISMO
Subfuncao.....: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa.....: 0018 UMA CIDADE PARA TODOS
Proj./Ativ....: 1192 PAVIMENT. ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS
Elemento.....: 449051000000 OBRAS E INSTALACOES
Fonte.....: 100077000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAME

C R E D O R

Nome...: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
Ender.: AVENIDA PADRE OPERARIO
Cidade: JUINA
CEP...: 78.320.000
Banco.: 000 No C/C: 0000000000000-

Cod.....: 00033025
000000 Licit....: 19/2020
UF: MT CNPJ/CPF: 37.683.896/0001.60
Insc. Est:
Insc. Mun: 000000000000
Insc. Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENT

Valor do Empenho.....R\$	793.125,77
Saldo Anterior.....R\$	636.926,85
Liquidacao 002 Parcela.....R\$	87.394,79
Saldo a Liquidar.....R\$	549.532,06

Proveniente de: VLR. RE.F. AO CONTRATO NR. 227/2020 COM OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY CONF SOLICI. DA SECRET. DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 019/2020


JUARA

, 24/03/2021.



ANDRECA APARECIDA DA SILVA
RESPONSAVEL PELA LIQUIDACAO

- RG/DOC: _____



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte			
Nome/Razão Social CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI		Documento (CPF/CNPJ) 37.683.896/0001-60	
Logradouro Rua	nº 0	Bairro SAO JOSE OPERARIO	CEP 78320-000
Complemento SEM COMPLEMENTO		Cidade/Estado JUINA/MT	

Tributos e Valores

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (12) R\$ 1.756,64

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
6684/2021	26/03/2021	1 de 1	R\$ 1.756,64
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 28262132100043018	Vencimento 26/04/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações RETENÇÃO REFERENTE A NOTA Nº 09, EMPRESA CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI - CNPJ: 37.683.896/0001-60.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Linha Digitável 00190.00009 02826.213213 00043.018175 1 86020000175664			R\$ 1.756,64

IMPOSTO RETIDO

29 MAR

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 2271/2020

OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial em Ruas do Bairro Portal das Flores e Parque Kennedy no Município de Juara/MT

EMPRESA: Construtora Nascimento Eireli CNPJ: 37.683.896/0001-60

PROPR: Prefeitura Municipal de Juara - MT CNPJ: 15.072.663/0001-99

Engenheiro Responsável pela Execução: Gisley Amorim Brito CREA RN 1012687538

Engenheiro Responsável pela Fiscalização: Allan Sales Gomes CREA RN 241847077-6

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY - JUARA - MT

SINAP - JANEIRO/2020 COM DESONERAÇÃO

B.D.I. TRANSP. 16,75%
26,74%

Local: Fonte de Pesquisa:

Data: ago/20


Item	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇOS		2ª MEDIÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		PERÍODO DA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		AGILIDADE TOTAL	
					Unit.	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
					COM BDI	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	16.958,00	0,13	2.202,54												
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (dimensão 4,00x5,00m)	m2	20,00	519,63	10.392,60												
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00X3,00 METROS - 2 unidades)	m2	12,00	392,89	4.714,68												
		1º SUB-TOTAL				17.308,82												
2.0		TERRAPLANAGEM																
2.1	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m3	6.387,35	3,17	20.279,59												
2.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	566,00	5,70	3.226,20												
		2º SUB-TOTAL				23.505,79												
3.0		PAVIMENTAÇÃO																
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m2	16.958,00	0,70	11.870,60												
3.2	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	2.758,10	5,07	13.983,56												
3.3	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	2.758,10	5,07	13.983,56												
3.4	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	5.516,20	1,39	7.667,51												

Handwritten signature

3.5	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 01/2018	txkm	20.685,75	0,53	10.953,44	0,00	R\$ 0,00	4.222,69	R\$ 2.218,50	4222,69	R\$ 2.218,50	20,24%
3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 01/2018	txkm	82.743,00	0,53	43.583,79	0,00	R\$ 0,00	16.890,76	R\$ 8.873,98	16890,76	R\$ 8.873,98	20,36%
3.7	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 09/2017	m2	15.652,40	8,24	128.975,77	0,00	R\$ 0,00	5.328,20	R\$ 43.894,24	5328,20	R\$ 43.894,24	34,03%
3.8	97807	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF. 01/2018	m2	15.652,40	13,94	218.194,45	0,00	R\$ 0,00	5.328,20	R\$ 74.282,57	5328,20	R\$ 74.282,57	34,04%
3.9	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016 (DMT 700km)	txkm	43.513,67	0,53	23.062,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.10	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRISCO) (DMT 200 km)	txkm	78.230,70	0,53	41.462,27	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.11	72845	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	399,14	3,80	1.516,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.12	99060	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	UND	10,00	95,06	950,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3º SUB-TOTAL						516.214,52				R\$ 147.100,23		R\$ 147.100,23	28,50%
4.0		OBRAS COMPLEMENTARES											
		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF. 06/2016	m	4.168,00	53,23	221.862,64	1358,00	R\$ 72.287,43	0,00	R\$ 0,00	1358,00	R\$ 72.287,43	32,58%
4.1	94269	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (ensaios de compactação da sub-base e base)	m³	2.758,10	1,84	5.074,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (regulamentação de transito "PARE" E "40KM") (18 unid. PARE ; 6unid. 40km)	m2	6,78	849,16	5.757,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3	34723	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (comprimento de 2,60m)	m	62,40	54,50	3.400,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4	35275					236.095,64		R\$ 72.287,43		R\$ 0,00		R\$ 72.287,43	30,62%
4º SUB-TOTAL						793.125,77							
TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO								R\$ 87.394,79		R\$ 156.198,92		R\$ 243.593,70	30,71%
ACUMULADO TOTAL													

TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO R\$: 87.394,79 (OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

JUARA-MT, 23 de Março de 2021


 Allan Sales Gomes
 Engenheiro Civil - CREA RN 2418470776
 Engenheiro Fiscal de Obras - Portaria 196/2021



REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO

Allan Sales Gomes
Engenheiro Civil
CREARNP N° 2418470776
Port. N° 196 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - MT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO PORTAL DAS FLORES E BAIRRO PARQUE KENNEDY




22/03/2021
S 11° 13' 57" W 57° 30' 52"
Pav. Asfáltica - Portal das Flores

Coordenadas	Localização	PLACA DE EXECUÇÃO DE OBRAS
	RUA	
	AMAZONAS	




23/03/2021
S 11° 16' 19" W 57° 31' 3"
Pav. Asfáltica e drenagem Sup.

Coordenadas	Localização	PLACA DE EXECUÇÃO DE OBRAS
	RUA GENESIO	
	BORGES TEIXEIRA	

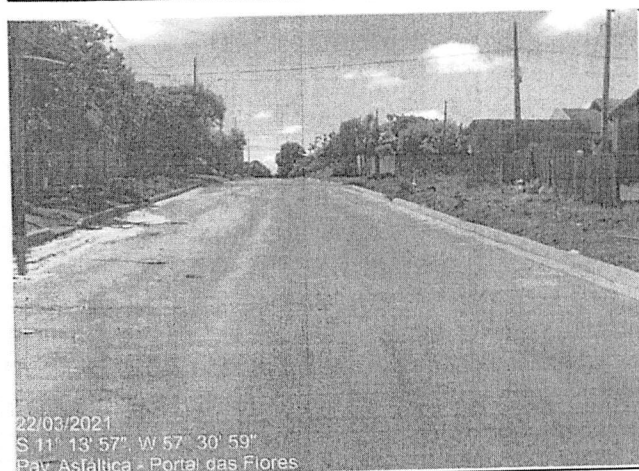

22/03/2021
S 11° 13' 57" W 57° 30' 59"
Pav. Asfáltica - Portal das Flores

Coordenadas	Localização	Execução de meio fio sarjeta
	RUA	
	AMAZONAS	

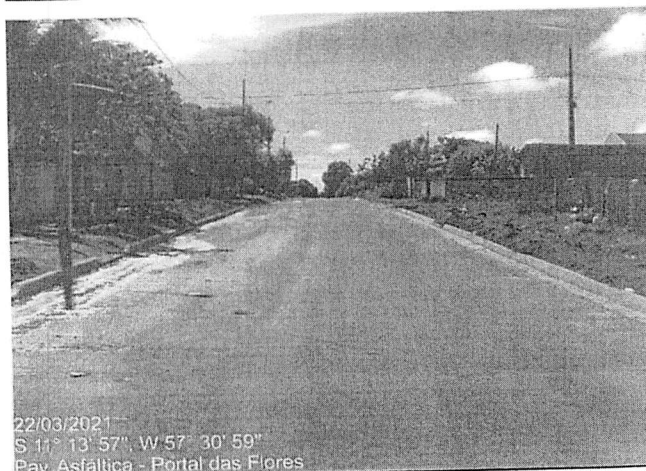

22/03/2021
S 11° 13' 57" W 57° 30' 59"
Pav. Asfáltica - Portal das Flores

Coordenadas	Localização	Execução de meio fio sarjeta
	RUA	
	AMAZONAS	



22/03/2021
S 11° 13' 47" W 57° 30' 59"
Pav. Asfáltica - Portal das Flores

Coordenadas	Localização	Execução de meio fio sarjeta
	RUA DAS	
	MARGARIDAS	



22/03/2021
S 11° 13' 51" W 57° 30' 59"
Pav. Asfáltica - Portal das Flores

Coordenadas	Localização	Execução de meio fio sarjeta
	RUA UBERABA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

9

CONSTRUTORA NASCIMENTO

Razão social: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 37.683.896/0001-60

Inscrição Municipal: 14305775231

Rua: PADRE DUILIO LIBURDI, 515 N [LOTE 01 QUADRA03] - SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT -

CEP: 78320-000

E-mail

Telefone:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 24/03/2021 - 10:19:51	Código de autenticidade 9855fd635b55eb8c ee21 fdd1 aa20 e5d0
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjunam/#!/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.072.663/0001-99	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social JUARA PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço Rua NITEROI	Número 500	Complemento CAIXA POSTAL 0001	Bairro CENTRO
Cidade / UF JUARA - MT	CEP 78575-000	Telefone	E-mail

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
7.02 - Execução por adm. empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elet. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.

Anexo
2017

SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 87.394,79	R\$ 87.394,79	R\$ 0,00	R\$ 87.394,79

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.756,64

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 87.394,79	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 1.756,64	Valor líquido R\$ 85.638,15	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 87.394,79	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$ 1.756,64	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.756,64

Observações

REQUISIÇÃO Nº 107/2021

TOMADA DE PREÇO- 19/2020 PEDIDO 1046/2020

Allan Sales Gomes
Engenheiro Civil
CREA-RNP Nº 2418470778
Port. Nº 196 / 2021

ATÉSIU QUE RECEB.
MERC. / SERVIÇOS
EM 24 / 03 / 2021

PAGUE-SE

24 / 03 / 2021

SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 227/2020. CONTRATAÇÃO DL EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY DO MUNICIPIO DE JUARA/MT.

Informações complementares

Autenticidade Mecânica



9855fd635b55eb8c ee21 fdd1 aa20 e5d0

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 24/03/2021 - 10:19:51
Recebi(emos) de CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
9



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjunam/#!/autenticidade> utilizando o código 9855fd635b55eb8c ee21 fdd1 aa20 e5d0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

ADJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convenio SIN , de 15 de dezembro de 1970

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

Dados da NFS-e

Numero	Data de emissão	Código de autenticidade	Inscrição municipal
9	24/03/2021	9855fd635b55eb8cee21fdd1aa20e5d0	14305775231
Prestador do serviço			
CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI - 37.683.896/0001-60			
Tomador do serviço			
JUARA PREFEITURA MUNICIPAL - 15.072.663/0001-99			

Dados da correção

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
1	24/03/2021 15:29:28	Descrição do serviço

Conteúdo anterior

SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

Conteúdo novo

Ag. 0821

Cc 528797

CNPJ 3768960001-60

CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.683.896/0001-60

Certidão nº: 8673431/2021

Expedição: 11/03/2021, às 16:13:15

Validade: 06/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.683.896/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0031536716**

**Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 11/03/2021 Hora da emissão: 15:12:37

**Nome/denominação do sujeito passivo: Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ e PGE
do Estado de Mato Grosso
CNPJ: 37.683.896/0001-60**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 09/04/2021.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: TUTTTAM2LUAMA2L9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 37.683.896/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:22:20 do dia 20/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2021.

Código de controle da certidão: 6AF9.5F90.6DEB.D57D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Certidão Positiva com efeito de Negativa De Débitos do Contribuinte

Certidão nº / Ano	Emissão	Validade	
158/2021	24/03/2021	23/05/2021	
Nome/Razão Social		Matricula	CPF / CNPJ
CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI		178039	37.683.896/0001-60
Endereço		Número	Bairro
Rua Padre Duilio Liburdi		515 N	Sao Jose Operario
Complemento	Cidade - Estado		CEP
Lote 01 Quadra03	Juína - Mato Grosso		78320-000

Finalidade

Ao Contribuinte:

Certificamos, a requerimento de parte interessada que, revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, na repartição competente, encontramos débito inscrito nos livros de dívida Municipal em nome do contribuinte desta certidão, em forma de parcelamento, estando em dia com os pagamentos até a presente data.

Fica ressalvado os direitos da Fazenda Pública a futuros lançamentos ou verificações que forem posteriormente apurados.

A presente Certidão Positiva com efeito de Negativa de débitos Municipais terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data.

Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Juína - MT.


Sobre a certidão:

Verifique a autenticidade com o código abaixo:

Certidão emitida em: 24/03/2021
Certidão com Validade até: 23/05/2021



1696247172



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 37.683.896/0001-60
Razão Social: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
Endereço: AV PADRE DUILIO LIBURDI 515N / SAO JOSE OPERARIO / JUINA / MT /
78320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/03/2021 a 09/04/2021

Certificação Número: 2021031101261586386700

Informação obtida em 11/03/2021 16:14:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Memorando nº 087/SMC/2021

Juara - MT, 23 de MARÇO de 2021.

A Senhora
Elza Aparecida de Araújo K. Lima
Chefe do Setor de Fiscalização de Contratos

1924

Prezada Senhora,

Através deste, solicito a Vossa Senhoria emissão da requisição para a liquidação dos serviços referente a Planilha da 2ª Medição da obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY NO MUNICIPIO DE JUARA/MT" no valor de R\$ 87.394,79 (OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), em favor da Empresa CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 37.683.896/0001-60. Conforme tomada de preço nº. 091/2020, Contrato nº 227/2020 e Pedido nº 1046/2020, fonte de recurso 10077000 e Cód. Red. 976.

Sem mais, elevo protestos de estima e considerações.

Atenciosamente


Joaquim Tolovi Junior
Secretário Adjunto de Cidade
Portaria 058/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
PROTOCOLO Nº: 2721
DATA: 23/03/21

Carla H



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Memorando nº 095/SMC/2021

Juara - MT, 26 de MARÇO de 2021.

A Senhora
Elza Aparecida de Araújo K. Lima
Chefe do Setor de Fiscalização de Contratos

Prezada Senhora,

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 9 para a liquidação dos serviços referente a Planilha da 2ª Medição da obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY NO MUNICIPIO DE JUARA/MT" no valor de R\$ 87.394,79 (OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), em favor da Empresa CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 37.683.896/0001-60. Conforme tomada de preço nº. 091/2020, Contrato nº 227/2020 e Pedido nº 1046/2020, fonte de recurso 10077000 e Cód. Red. 976, conforme Requisição nº 107/2021.

Sem mais, elevo protestos de estima e considerações.

Atenciosamente


Allan Sales Gomes
Engenheiro Civil - Fiscal
Portaria 196/2021

Allan Sales Gomes
Engenheiro Civil
CREA RNP N° 2418470776
Port. N° ____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
PROTOCOLO Nº 3905
DATA 26/03/2021
HORÁRIO 14h

RECEBI 26/03/2021
ELZA
Fiscalização de Contratos



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 444
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/02/2021
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº: 73=372/0110
Data do Empenho: 5/10/2020

Refer. Empenho Nº: 008806/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000976 - 06.002.15.451.0018.1192-4490.51.00.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
Função de Governo: 15 - URBANISMO
SubFunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0018 - UMA CIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade (Ação): 1192 - PAVIMENT. ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	793.125,77
Saldo Anterior:	793.125,77
O.P. 001 Parcela	156.198,92
Saldo a Pagar:	636.926,85

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 09 8	ISSQN - PREST SERV. NA FONTE A RECOLHER - GERAL	-3.139,60

0,00
Total de Consignações: -3.139,60
Valor Líquido à Pagar: 153.059,32
Cód: 33025
Conta:

Pague-se à CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 37.683.896/0001.60 Banco: Agência:
à quantia de CENTO E CINQUENTA E TRES MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VLR. RE.F. AO CONTRATO NR. 227/2020 COM OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY CONF SOLICI. DA SECRET. DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 019/2020

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B.BRASIL - F.P.M	11.005-1	21001	153.059,32
					153.059,32

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____
RG/DOC: _____

JUARA - MT, 10 de Fevereiro de 2021.

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretario (a)

10/02/2021

Banco do Brasil

G3351016410433631
10/02/2021 16:50:16



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.17
2836302836 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA

AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE JUARA

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0821-4 - SICREDI VALE DO JURUENA

CONTA: 52.879-7

FAVORECIDO: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 37.683.896/0001-60

VALOR: R\$ 153.059,32

DEBITO EM: 10/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 5.8ED.49D.C7C.8A1.372

10/02/2021

Banco do Brasil

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32
283602836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.005-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2021
NR. DOCUMENTO	662.836.000.011.322
VALOR TOTAL	3.139,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE JUARA ISSQN	
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 11.322-0	
NR. DOCUMENTO	662.836.000.011.005
NR. AUTENTICACAO	8.47A.792.D6E.DFC.260

=====

Transação efetuada com sucesso por: JC862863 JOSE R P ALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

NOTA DE LIQUIDACAO N° 000013 Ref. Empenho N°.: 008806/2020
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Ref. Apenso N°: 332/0110
 Data do Empenho: 05/10/2020

Data de Emissao: 04/02/2021

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0976
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
 Unidade.....: 002 DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
 Funcao.....: 15 URBANISMO
 Subfuncao.....: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa.....: 0018 UMA CIDADE PARA TODOS
 Proj./Ativ....: 1192 PAVIMENT. ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS
 Elemento.....: 449051000000 OBRAS E INSTALACOES
 Fonte.....: 100077000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAME

C R E D O R

Nome...: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
 Ender.: AVENIDA PADRE OPERARIO
 Cidade: JUINA
 CEP...: 78.320.000
 Banco.: 000
 No C/C: 00000000000000-
 Cod.....: 00033025
 000000 Licit....: 19/2020
 UF: MT CNPJ/CPF: 37.683.896/0001.60
 Insc.Est:
 Insc.Mun: 000000000000
 Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS

Valor do Empenho.....R\$	793.125,77
Saldo Anterior.....R\$	793.125,77
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	156.198,92
Saldo a Liquidar.....R\$	636.926,85

Proveniente de: VLR. RE.F. AO CONTRATO NR. 227/2020 COM OBJETO DE PRESTACAO
 DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM
 RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY CONF
 SOLICI. DA SECRET. DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO
 019/2020


JUARA

, 04/02/2021.



ANDRECA APARECIDA DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

- RG/DOC: _____



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte			
Nome/Razão Social CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI		Documento (CPF/CNPJ) 37.683.896/0001-60	
Logradouro Rua		Bairro SAO JOSE OPERARIO	
Avenida PADRE OPERARIO		CEP 78320-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO		Cidade/Estado JUINA/MT	

Tributos e Valores	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (12)	
R\$ 3.139,60	

Número do Documento 4599/2021	Data do Processamento 09/02/2021	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 3.139,60
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 28262132100041672	Vencimento 01/03/2021	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08.			(+) Juro
IMPOSTO RETIDO 10 FEV			(+) Mora Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 3.139,60
Linha Digitável 00190.00009 02826.213213 00041.672171 4 854600003139601 Prefeitura Municipal de Juara			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 227/2020
 OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial em Ruas do Bairro Portal das Flores e Parque Kennedy no Município de Juara/MT
 EMPRESA: Construtora Nascimento Eireli CNPJ: 37.683.896/0001-60
 PROPR: Prefeitura Municipal de Juara - MT CNPJ: 15.072.663/0001-99
 Engenheiro Responsável pela Execução: Gisley Amorim Brito CREA RN 1012687538
 Engenheiro Responsável pela Fiscalização: Gustavo Cezar Ferreira CREA/MT 038912
 Refer: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL
 Local: RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY - JUARA - MT
 Fonte de Pesquisa: SINAP - JANEIRO/2020 COM DESONERAÇÃO

B.D.I. TRANSP. 16,75%
 26,74%


				PREÇOS		PERÍODO DA MEDIÇÃO		
						05/10/2020 A 20/01/2021		
						1ª MEDIÇÃO		
Item	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	Unit. COM BDI	TOTAL	QUANT.	VALOR
								% EXEC.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	16.958,00	0,13	2.202,54	5.764,40	R\$ 730,58
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (dimensão 4,00x5,00m)	m2	20,00	519,63	10.392,60		
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00X3,00 METROS - 2 unidades)	m2	12,00	392,89	4.714,68		
						17.309,82		R\$ 730,58
		1º SUB-TOTAL						4,22%
2.0		TERRAPLANAGEM						
2.1	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m3	6.397,35	3,17	20.279,59	2.126,23	R\$ 6.736,96
2.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	566,00	5,70	3.226,20	286,00	R\$ 1.631,14
						23.505,79		R\$ 8.368,10
		2º SUB-TOTAL						35,60%
3.0		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	16.958,00	0,70	11.870,60	5.764,40	R\$ 4.018,19
3.2	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	2.758,10	5,07	13.983,56	1.068,48	R\$ 5.416,77
3.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	2.758,10	5,07	13.983,56	1.068,48	R\$ 5.416,77
3.4	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	5.516,20	1,39	7.667,51	2.136,96	R\$ 2.979,22
3.5	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM) AF_01/2018	txkm	20.685,75	0,53	10.963,44	4.222,89	R\$ 2.218,50
3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_01/2018	txkm	82.743,00	0,53	43.583,79	16.890,76	R\$ 8.873,98
3.7	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m2	15.652,40	8,24	128.975,77	5.328,20	R\$ 43.894,24
3.8	97807	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	m2	15.652,40	13,94	218.194,45	5.328,20	R\$ 74.282,57
3.9	95176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (DMT 700km)	txkm	43.513,67	0,53	23.062,24		
3.10	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRISCO) (DMT 200 km)	txkm	78.230,70	0,53	41.462,27		
3.11	72845	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	399,14	3,80	1.516,73		
3.12	99060	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	UND	10,00	95,06	950,60		
						516.214,52		R\$ 147.100,23
		3º SUB-TOTAL						28,50%
4.0		OBRAS COMPLEMENTARES						


9

4.1	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	m	4.168,00	53,23	221.862,64			
4.2		CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (ensaio de compactação da sub-base e base)	m³	2.758,10	1,84	5.074,90			
4.3	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (regulamentação de trânsito "PARE" E "40KM") (18 unid. PARE : 6unid. 40km)	m²	6,78	849,16	5.757,30			
4.4	35275	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (comprimento de 2,60m)	m	62,40	54,50	3.400,80			
4º. SUB-TOTAL						236.095,64			
				TOTAL GERAL R\$		793.125,77			
				TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO			R\$ 156.198,92	19,69%	

TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO R\$: 156.198,92 (Cento e cinquenta e seis mil cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos).

JUARA-MT 20 de Janeiro de 2021


 Engº Gustavo Cezar Ferreira
 Crea/MT 038912
 Port. Fiscal N° 1.038/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

8



CONSTRUTORA NASCIMENTO

Razão social: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 37.683.896/0001-60

Inscrição Municipal: 14305775231

Rua: PADRE DUILIO LIBURDI, 515 N [LOTE 01 QUADRA03] - SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT -

CEP: 78320-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/02/2021 - 09:12:36	Código de autenticidade 8a83 1f83 3da4 63b0 18db d5ec 99e4 928e	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinam/#!/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.072.663/0001-99	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social JUARA PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço Rua NITEROI	Número 500	Complemento CAIXA POSTAL 0001	Bairro CENTRO
Cidade / UF JUARA - MT	CEP 78575-000	Telefone	E-mail

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment. concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.

Alíquota
2,01 %

Descrição do serviço
PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 156.198,92	Valor bruto do serviço R\$ 156.198,92	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 156.198,92
----------------	-------------	-----------------------	---	--	-------------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 3.139,60
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-----------------------

Resumo geral

Resumo geral					Valor líquido	Valor da dedução construção civil
Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções		R\$ 153.059,32	R\$ 0,00	
R\$ 156.198,92	R\$ 0,00	R\$ 3.139,60				
Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?	
R\$ 156.198,92	2,01	R\$ 3.139,60	0,00	R\$ 3.139,60	Sim	
			PAGUE-SE	RECEBI		
			MERC / SERVIÇOS			

Observações

REQUISIÇÃO Nº 107/2021

TOMADA DE PREÇO- 19/2020 PEDIDO 1046/2020

PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 227/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY DO MUNICÍPIO DE JUARA/MT.

Informações complementares

Autenticidade Mecânica:



Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

8

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação: Exigível
Data/hora de emissão da NFS-e: 04/02/2021 - 09:12:36
Recebi(emos) de CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinam/#!/autenticidade> utilizando o código: 8a831f833da463b018dbd5ec99e4928e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Número do documento

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

8

Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e



CONSTRUTORA NASCIMENTO

Razão social: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 37.683.896/0001-60

Inscrição Municipal: 14305775231

Rua: PADRE DUILIO LIBURDI, 515 N [LOTE 01 QUADRA03] - SAO JOSE OPERARIO - JUÍNA - MT -

CEP: 78320-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)



MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.683.896/0001-60

Certidão nº: 2440639/2021

Expedição: 21/01/2021, às 18:27:29

Validade: 19/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.683.896/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0030936503**

**Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: 21/01/2021 Hora da emissão: 17:25:59

**Nome/denominação do sujeito passivo: Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ e PGE
do Estado de Mato Grosso**
CNPJ: 37.683.896/0001-60

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 19/02/2021.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: T7292A72AMAUU2LU



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 37.683.896/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:22:20 do dia 20/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2021.

Código de controle da certidão: **6AF9.5F90.6DEB.D57D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.683.896/0001-60
Razão Social: CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI
Endereço: AV PADRE DUILIO LIBURDI 515N / SAO JOSE OPERARIO / JUINA / MT /
78320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/01/2021 a 11/02/2021

Certificação Número: 2021011302565703893310

Informação obtida em 21/01/2021 18:26:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Memorando nº 011/SMC/2021

Juara - MT, 20 de janeiro de 2021.

A Senhora
Elza Aparecida de Araújo K. Lima
Chefe do Setor de Fiscalização de Contratos

Prezada Senhora,

Através deste, solicito a Vossa Senhoria emissão da requisição para a liquidação dos serviços referente a Planilha da 1ª Medição da obra "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY NO MUNICIPIO DE JUARA/MT" no valor de R\$ 156.198,92 (cento e cinquenta e seis mil cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), em favor da Empresa CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI inscrita no CNPJ n.º 37.683.896/0001-60. Conforme tomada de preço n.º 091.2020 Contrato nº 227/2020 e Pedido nº 1046/2020, fonte de recurso 10077000 e Cód. Red. 976.

Sem mais, relevo protestos de estima e considerações.

Atenciosamente

Joaquim Tolovi Junior
Secretário Adjunto de Cidade

PREFEITURA MUN. DE JUARA
PROTOCOLO Nº 716
DATA 20 / 01 / 2021
HORARIO 14 / 24 h.
70



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Memorando nº 014/SMC/2021

Juara - MT, 22 de Janeiro de 2021.

A Senhora
Elza Aparecida de Araújo K. Lima
Chefe do Setor de Fiscalização de Contratos
Juara – MT

Prezada Senhora,

Encaminho a Vossa Senhoria Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº5/2021, no valor de R\$: 156.198,92 (cento e cinquenta e seis mil cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) para pagamento da prestação de serviços realizados pela Empresa CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI no qual atesto a realização do mesmo referente ao período de 01/12/2020 a 21/01/2021, onde atendeu a Secretaria Municipal de Cidades para A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL, referente ao Contrato N° 227/2020 apenso a Tomada de Preço 019/2020, Pedido N° 1046/2020. REQ. 107/2021.

Cod. Red. 976

Sem mais, elevo protestos de estima e considerações

Atenciosamente,


Joaquim Tolovi Junior
Secretario Adjunto de Cidade

PREFEITURA MUN. DE JUARA
PROTOCOLADO Nº 830
DATA 22/01/2021
HORÁRIO 16:13 h.
70



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Memorando nº 029/SMC/2021

Juara - MT, 04 de fevereiro de 2021.

A Senhora

Elza Aparecida de Araújo K. Lima

Chefe do Setor de Fiscalização de Contratos

Juara – MT

Prezada Senhora,

Encaminho a Vossa Senhoria Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº8/2021, no valor de R\$: 156.198,92 (cento e cinquenta e seis mil cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) para pagamento da prestação de serviços realizados pela Empresa CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI no qual atesto a realização do mesmo referente ao período de 01/12/2020 a 21/01/2021, onde atendeu a Secretaria Municipal de Cidades para A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL, referente ao Contrato N° 227/2020 apenso a Tomada de Preço 019/2020, Pedido N° 1046/2020. REQ. 107/2021.

Informo que a Nota Fiscal encontra-se atestada pelo Secretário Adjunto de Cidade, visto que a empresa contratada para fiscalizar a obra, juntamente com o engenheiro fiscal, teve seu contrato rescindido. A Nota Fiscal contempla os serviços fiscalizados e medidos pelo Engenheiro Fiscal da Obra – Gustavo C. Ferreira.

Cod. Red. 976

Sem mais, elevo protestos de estima e considerações

Atenciosamente,


Joaquim Tolovi Junior
Secretario Adjunto de Cidade
Portaria 058/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001-99
RUA NITEROI, Nº 81 - CENTRO - CEP 78.575-000
Telefone: (66)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 8806/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 05/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Tom.Precos	19/2020	Adiantamento:	Não	
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	227/2020	Obra:	96	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:				Dívida Fundada:	
Apenso:							

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Especial
Dotação:	0976 - 06.002.15.451.0018.1192-4.4.90.51.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade Orçamentária:	002 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
Função de Governo:	15 - URBANISMO
Subfunção de Governo:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0018 - UMA CIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade (Ação):	1.192 - PAVIMENT. ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS
Elemento de Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza do Bem:	34 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recursos:	100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC
Tipo de Despesa:	01.213 - OBRAS

FAVORECIDO

Credor:	33025 - CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI	CNPJ:	37.683.896/0001-60
Endereço:	AVENIDA PADRE OPERARIO, nº - SAO JOSE OPERARIO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	(69)8445-0549
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: VLR. RE.F. AO CONTRATO NR. 227/2020 COM OBJETO DE PRESTACAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES E PARQUE KENNEDY CONF SOLICI. DA SECRET. DE CIDADES NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 019/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.169.015,11	Valor Empenhado:	793.125,77	Saldo Atual da Dotação:	375.889,34
Valor por extenso:	SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 793.125,77 conforme comprovantes.
JUARA - MT, 05 de outubro de 2020.

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Contador(a)
CRC - CRC 3582/0-8 MT

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

Usuário Emissor: ANDREÇA - ANDREÇA APARECIDA DA SILVA
